

評価軸③-5

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目		評価対象年度	令和2年度
大路広場整備事業		現在の状況 ☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手	
事業期間	平成28年度～令和2年度		
支援事業名	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)		
計画に記載している内容	古代多賀城における方格地割りの基準となる南北路と東西大路の交差点部分を中心に表示し、併せて古代都市多賀城の説明板を設置する。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
発掘調査結果などを踏まえて、古代多賀城と城外の街並みの関係性を知るきっかけを探ることができた。			
進捗状況 ※計画年次との対応		実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
☐ 計画どおり進捗している ☒ 計画どおり進捗していない		整備内容について担当部局で検討中である。今後、第2期計画でどのような方向性で進めていくのか決定する。	
状況を示す写真や資料等			



大路広場整備基本構想イメージ図

評価軸③-6

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

		評価対象年度	令和2年度
項目		現在の状況	
無電柱化事業		☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手	
事業期間	平成25年度～令和2年度		
支援事業名	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)		
計画に記載している内容	多賀城跡において、歴史的景観を阻害している電線電柱類を地中化し、史跡内の環境整備の一層の充実を図る。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
景観を阻害している電線電柱類の地中化について事業実施を予定していたところ、建物移転交渉に係る協議が令和元年度内に整ったことから、令和2年度で電線電柱類を除却する方向で進めることができた。			
進捗状況 ※計画年次との対応		実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)	
☐ 計画どおり進捗している ☒ 計画どおり進捗していない		東北電力との協議に時間を要したため、令和2年度内での除却をすることができなかったため、第2期計画における多賀城南門復元の周辺整備事業で実施する。	
状況を示す写真や資料等			

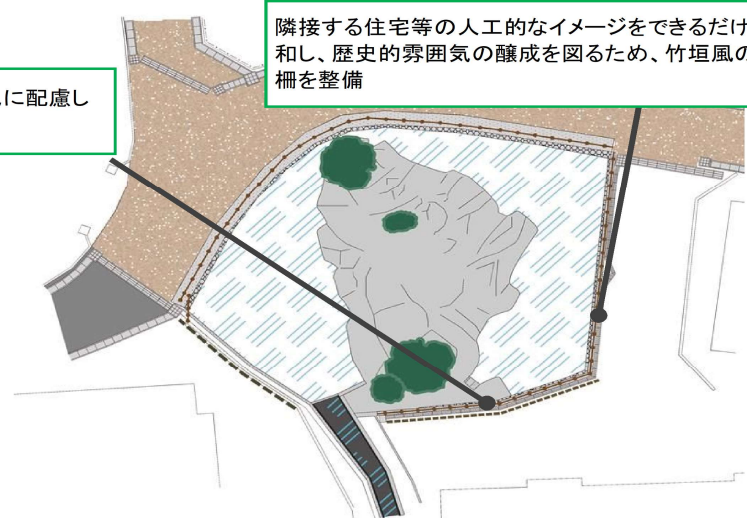


整備基本計画図

※特別史跡多賀城附寺跡整備基本計画(宮城県策定)より抜粋

評価軸③-7

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項

項目		評価対象年度	令和2年度
		現在の状況	
歌枕環境整備事業		☐ 実施済 ☒ 実施中 ☐ 未着手	
事業期間	平成26年度～令和2年度		
支援事業名	社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)		
計画に記載している内容	興井について、水質汚濁が著しいため、水環境を改善する整備を実施する。あわせて、沖の井に接続されている水路についても整備を行う。さらに、周辺の住環境を歌枕のイメージに合うよう規制を図り、修景整備を行うとともに、震災により被災した部分の修理も実施する。		
定性的・定量的評価(自由記述) ※定量的評価は可能な範囲で			
令和2年度は興井の整備を実施した。 ・興井は修景整備工事として、目隠しフェンス及び転落防止柵を設置した。			
進捗状況 ※計画年次との対応	実施・検討にあたっての課題と対応方針(自由記述)		
☒ 計画どおり進捗している ☐ 計画どおり進捗していない			
状況を示す写真や資料等			
興井整備 目隠しフェンスの設置 転落防止柵の整備 隣接する住宅等の人工的なイメージをできるだけ緩和し、歴史的雰囲気醸成を図るため、竹垣風の柵を整備 景観向上を図るため、景観色に配慮した柵を整備  			
目隠しフェンス等の設置状況			

