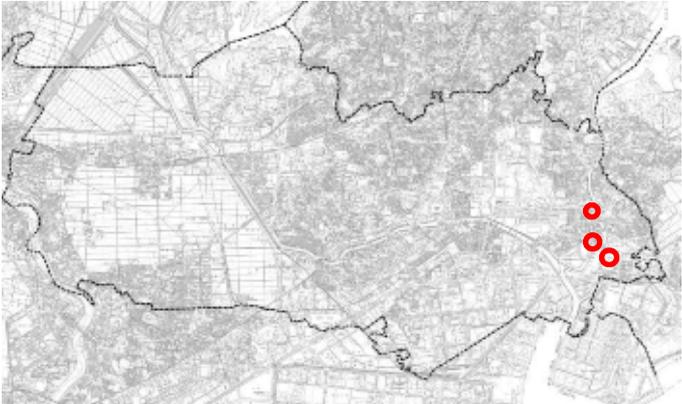


【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 D-21-2 事業名 下水道事業(雨水ポンプ増設整備)
事業費 総額 3,557,608 千円 (内訳: 本工事費 3,235,624 千円、調査設計費 145,778 千円、 用地費 83,861 千円、補償費 92,345 千円)
事業期間 平成 24 年度～平成 31 年度
事業目的・事業地区 東日本大震災の地震による地盤沈下及び津波被害を踏まえ、内水排除困難区域(八幡、桜木、栄、明月、宮内、大代地区)における排水機能の向上、衛生的な生活環境・企業経営環境の再生を目指して、雨水ポンプ場の整備を行う。
位置図 
事業結果 対象施設: 大代ポンプ場、大代第 5 排水区ポンプ場、大代東ポンプ場 <平成 25 年度～平成 30 年度> ・ 調査設計 145,778 千円 <平成 26 年度～平成 31 年度> ・ 本工事 3,235,624 千円 <平成 27 年度～平成 30 年度> ・ 用地買収 83,861 千円 <平成 28 年度～平成 31 年度> ・ 物件移転補償 92,345 千円
事業の実績に関する評価 ①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 ・ 本計画に基づき 10 年に 1 回程度発生が想定される大雨に対応するためのポンプ場が整備されたことから事業が適正に執行されていると判断される。 ②コストに関する調査・分析・評価 ・ コストについては比較できる直近の同種他事業が無いため分析は困難であるが、工事費については、経済性などを総合的に判断し、設計・工事を地方共同法人日本

下水道事業団に発注したことから、妥当であると判断できる。

③事業手法に関する調査・分析・評価

・本事業は、以下のとおり、事業を進めることができた。

<想定した事業期間>

調査設計	入札手続き・発注・完了	平成 25 年 4 月～平成 27 年 9 月
用地	完了	平成 27 年 4 月～平成 27 年 9 月
補償	完了	平成 27 年 10 月～平成 29 年 3 月
工事	入札手続き・発注・完了	平成 25 年 4 月～平成 29 年 3 月

<実際に事業に要した事業期間>

調査設計	入札手続き・発注・完了	平成 25 年 8 月～平成 30 年 8 月
用地	完了	平成 28 年 3 月～平成 30 年 12 月
補償	完了	平成 28 年 9 月～令和 2 年 2 月
工事	入札手続き・発注・完了	平成 26 年 9 月～令和 2 年 2 月

・用地買収や各種法手続きに時間を要した結果、事業完了が遅れてしまった。

事業担当部局

上下水道部施設整備課 電話番号：022-368-1141
