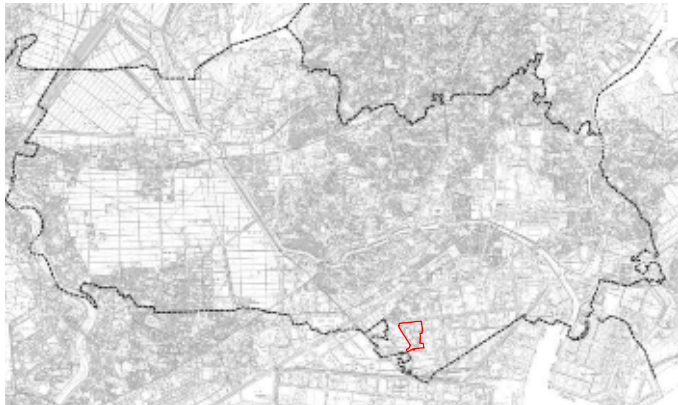


【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

事業番号 D-17-1 事業名 宮内地区被災市街地復興土地区画整理事業計画作成事業
事業費 総額 84,000 千円 (内訳: 調査設計費 84,000 千円)
事業期間 平成 24 年度～平成 25 年度
事業目的・事業地区 東日本大震災による地震・津波被害を受け、全壊割合が 100%近い被害が生じた宮内地区において、居住者、地権者が安心して現地再建を行えるための居住地環境向上を目指して、宅地の再整理、生活基盤の整備を行う被災市街地復興土地区画整理事業を実施するため、事業計画の作成を行ったもの。  位置図 
事業結果 地区名: 宮内地区 (対象区域面積: 7.2ha)  <平成 24 年度～平成 25 年度> ・ 調査設計 84,000 千円
事業の実績に関する評価 ①事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 ・ 本事業において事業計画を作成し、土地区画整理事業実施に当たっての必要な諸手続き (都市計画決定、事業認可等) を行うことによって、事業が円滑に進捗したものと判断される。  ②コストに関する調査・分析・評価 ・ 調査設計費については、見積書を徴集しプロポーザル方式によって、価格及び技術提案について総合的に評価を行い契約を締結していることから、当事業費は妥当であると判断される。  ③事業手法に関する調査・分析・評価 ・ 本事業は、以下のとおり、概ね予定どおり事業を進めることができた。

<想定した事業期間>

事業計画作成 入札手続き・発注・完了 平成24年1月～平成25年9月

<実際に事業に要した事業期間>

事業計画作成 入札手続き・発注・完了 平成24年1月～平成26年3月

・地権者との調整や法手続きを行うための関係機関との協議に多くの時間を要し、当初想定より期間を要したが、宮内地区被災市街地復興土地区画整理事業（D-17-2）と並行して進めることにより、概ね予定通り事業完了することができた。

事業担当部局

建設部都市計画課 電話番号：022-368-1141
